

ALLEGATO "A"

Comune di POLI
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

COMMITTENTE: COMUNE DI POLI

CANTIERE: LOCALITA' COLLE FATTORE, POLI (RM)

Roma, 04/01/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$Empty_CSP_04\$ \$Empty_CSP_03\$ \$Empty_CSP_02\$)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO PRO-TEMPORE \$Empty_COM_10\$ \$Empty_COM_09\$)




\$Empty_CSP_04\$ \$Empty_CSP_03\$ \$Empty_CSP_02\$
\$Empty_CSP_05\$
\$Empty_CSP_06\$ \$Empty_CSP_07\$ (\$Empty_CSP_08\$)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
\$Empty_CSP_11\$


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2	
		s1	s2	s3	s4	
Allestimento del cantiere	12 g					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	Z1				
Realizzazione della viabilità del cantiere	4 g		Z1			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z1		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	4 g		Z1			
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g			Z1		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g			Z1		
Montaggio e smontaggio della gru a torre	4 g					
Scavo di sbancamento	13 g			Z2		
Strutture di fondazioni in c.a.	12 g					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	9 g					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	3 g					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g					
Strutture in elevazione in c.a.	83 g					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	35 g					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	22 g					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g					
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	30 g					
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefal	12 g					
Rinterro di scavo	10 g					
Chiusure e divisori	53 g					
Realizzazione di tompagnature	44 g					
Realizzazione di divisori interni	34 g					
Copertura, balconi e logge	54 g					
Formazione di massetto per balconi e logge	11 g					
Impermeabilizzazione di balconi e logge	15 g					
Impermeabilizzazione di coperture	3 g					
Posa di pavimenti su balconi e logge	13 g					
Realizzazione di opere di lattoneria	15 g					
Posa di manto di copertura in tegole	13 g					
IMPIANTI	42 g					
Posa della centrale termica per impianto termico (centralizzat	5 g					
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar	3 g					
Realizzazione di impianto elettrico interno	30 g					


Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2	
		s1	s2	s3	s4
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	30 g				
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	8 g				
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	10 g				
Realizzazione di impianto di messa a terra	4 g				
Finiture esterne	19 g				
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	15 g				
Posa di rivestimenti esterni	8 g				
Pavimenti	24 g				
Formazione di massetto per pavimenti interni	17 g				
Posa di pavimenti per interni	14 g				
Finiture interne	37 g				
Formazione intonaci interni (tradizionali)	22 g				
Posa di rivestimenti interni	15 g				
Posa in opera di serramenti e ringhiere	30 g				
Posa di serramenti interni	15 g				
Posa di serramenti esterni	20 g				
Posa di ringhiere e parapetti	5 g				
Tinteggiature	23 g				
Tinteggiatura di superfici esterne	14 g				
Tinteggiatura di superfici interne	18 g				
IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	8 g				
Realizzazione di impianto solare termico	8 g				
Posa moduli fotovoltaici	8 g				
Smobilizzo del cantiere	2 g				
LEGENDA Zona:					
Z1 = AREA cantiere					
Z2 = AREA Scavo					
Z3 = AREA Fabbricato					

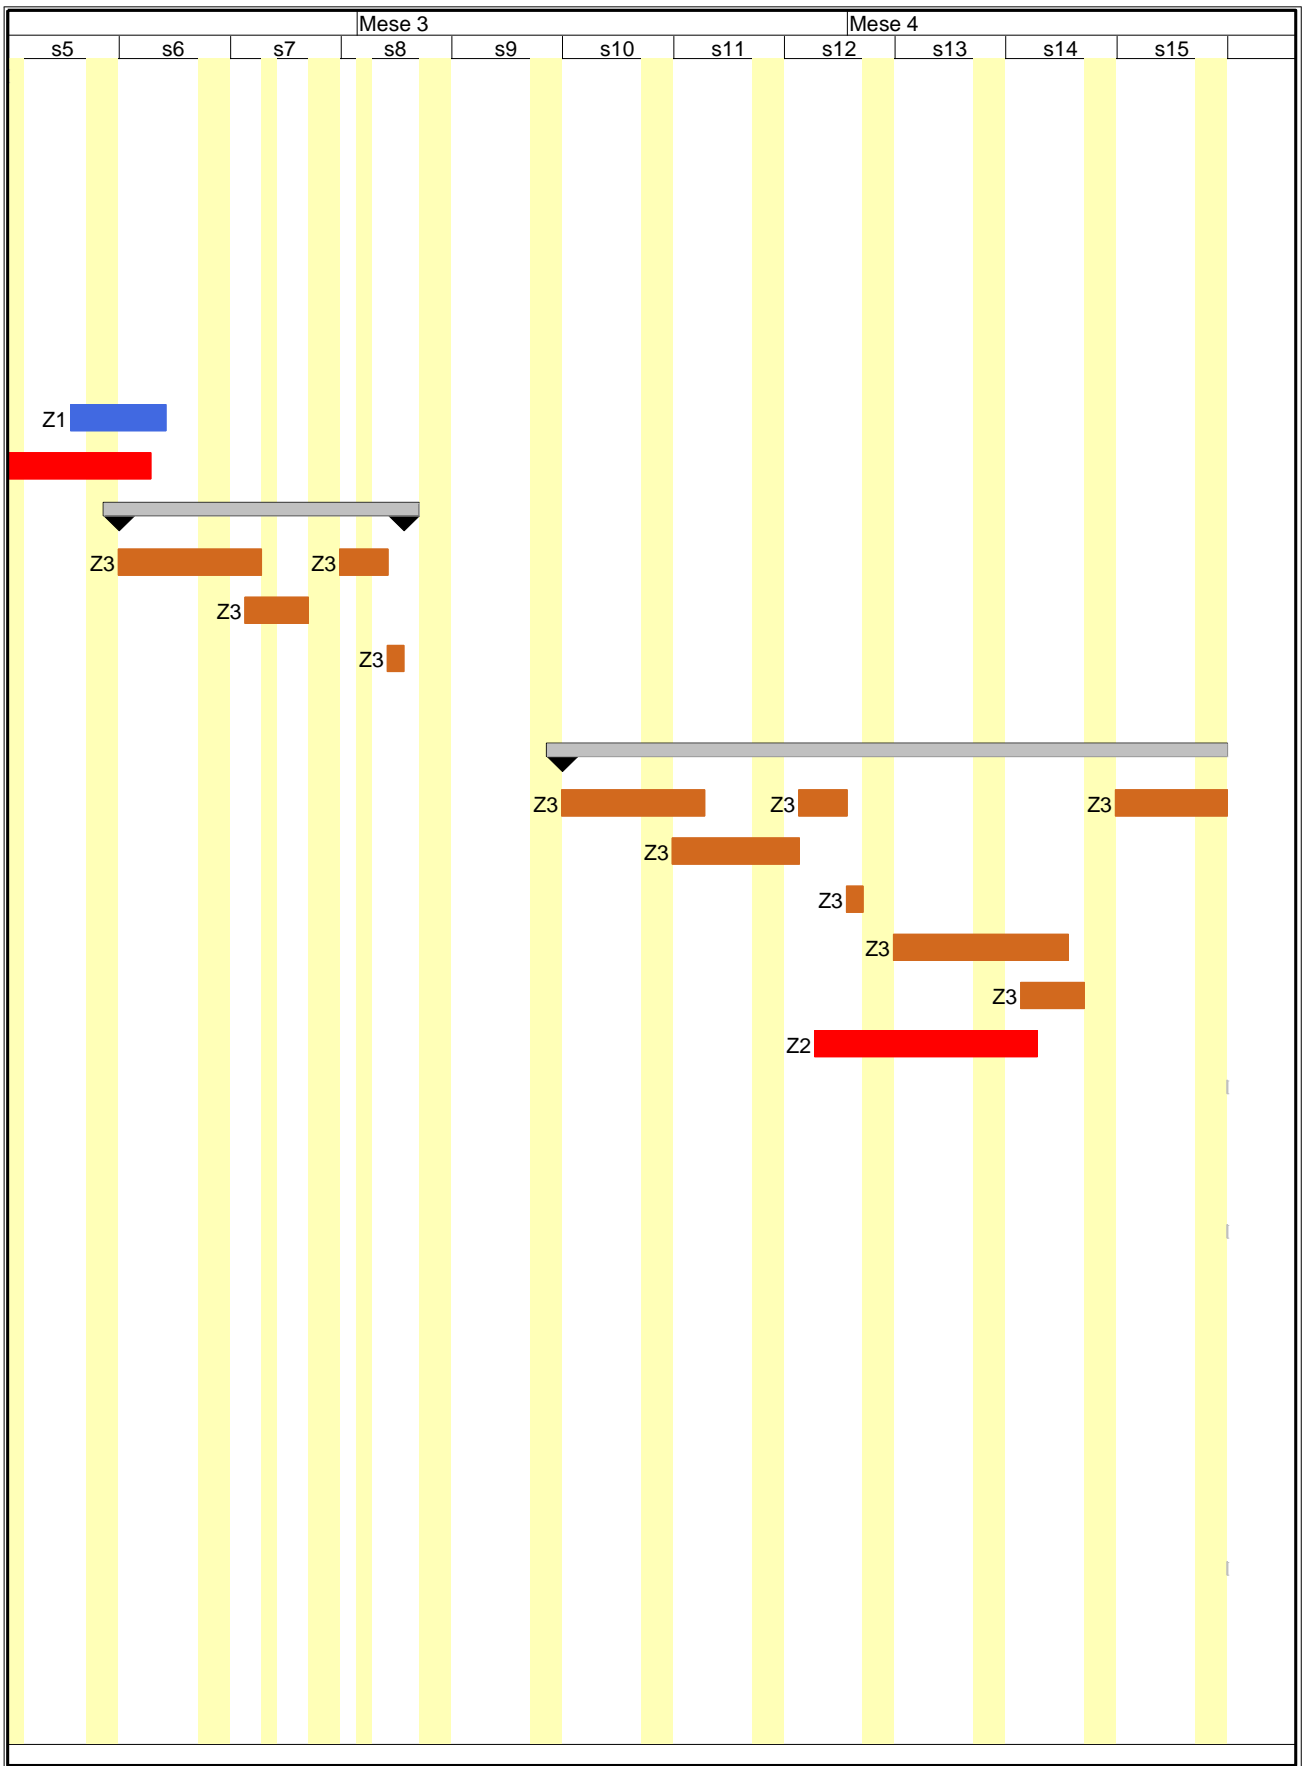


Mese 3					Mese 4					
s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15

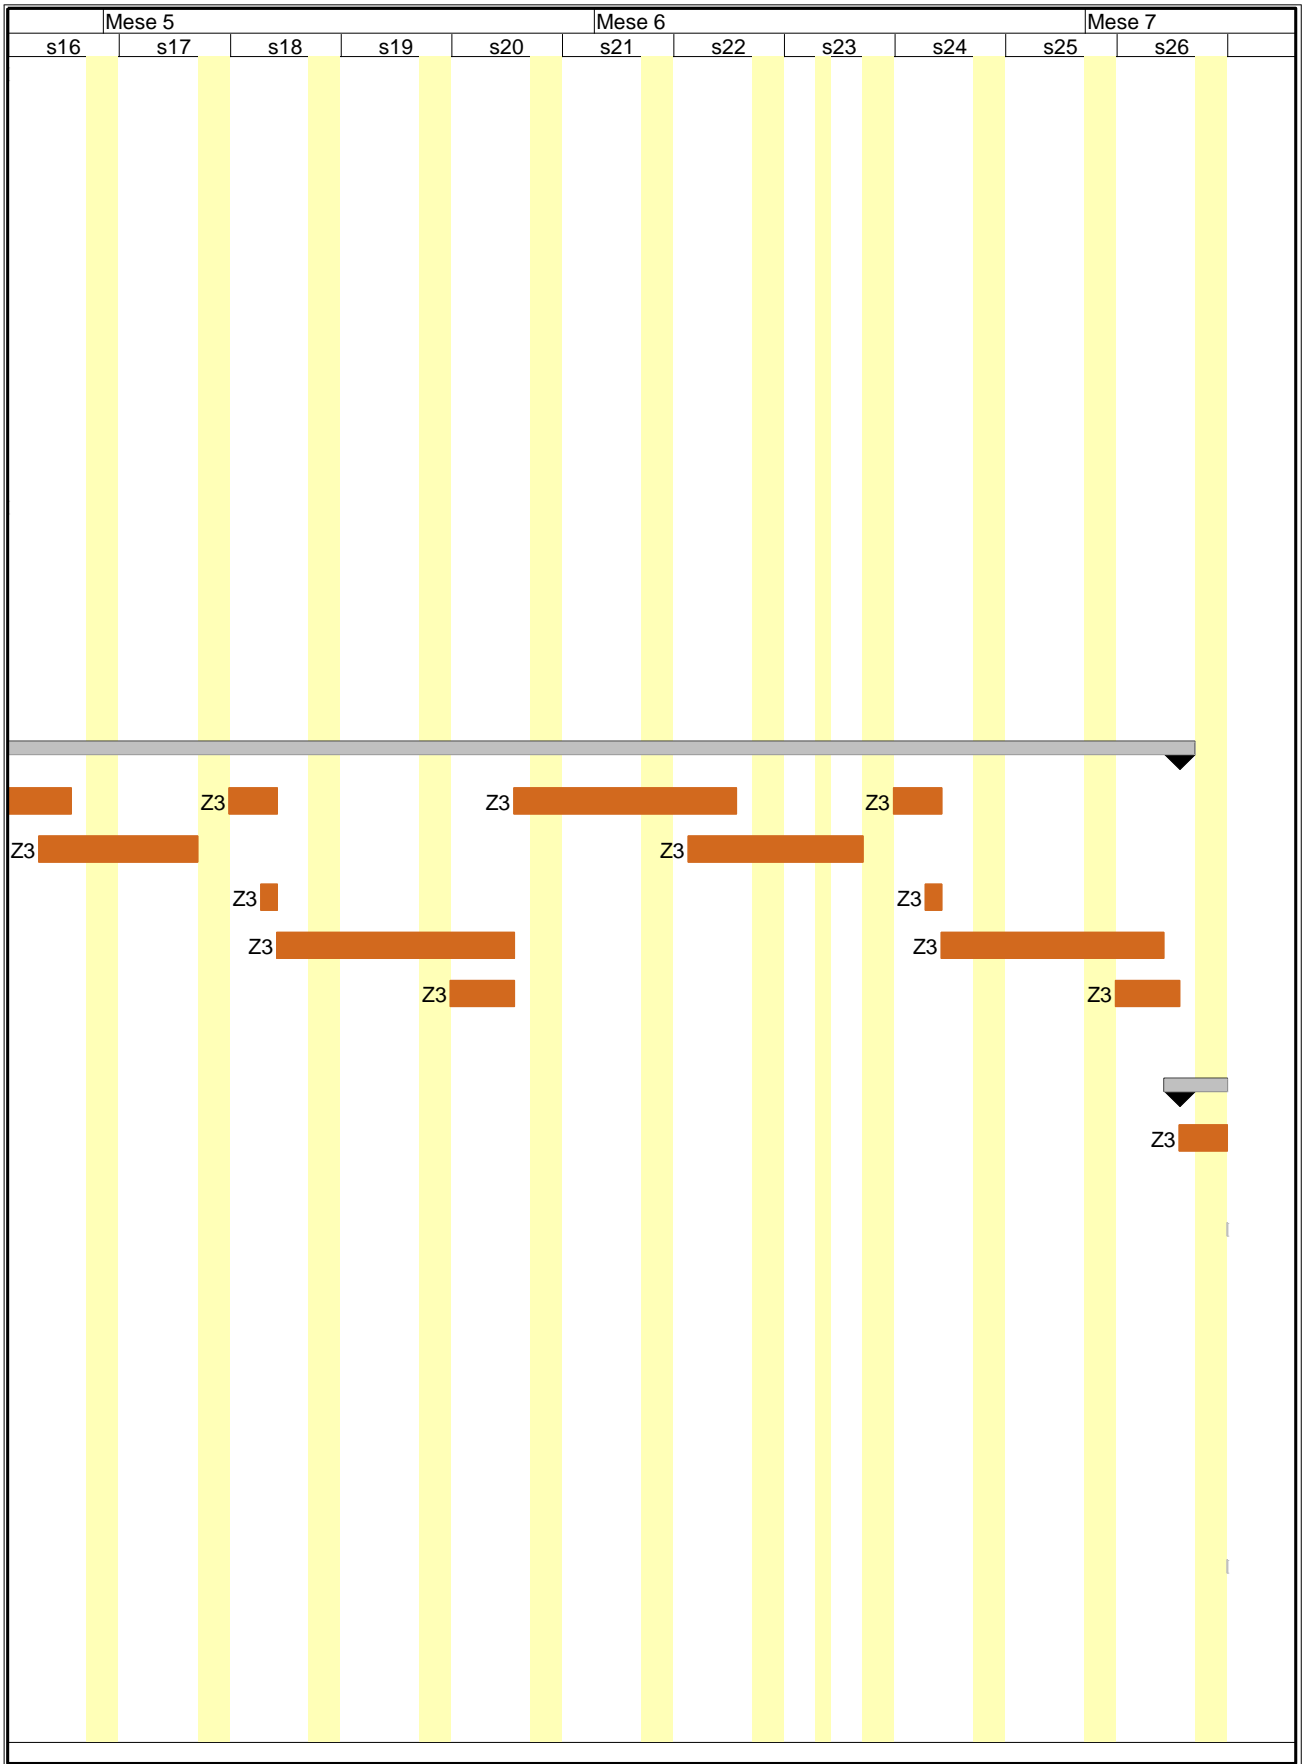


Mese 5				Mese 6				Mese 7			
s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	

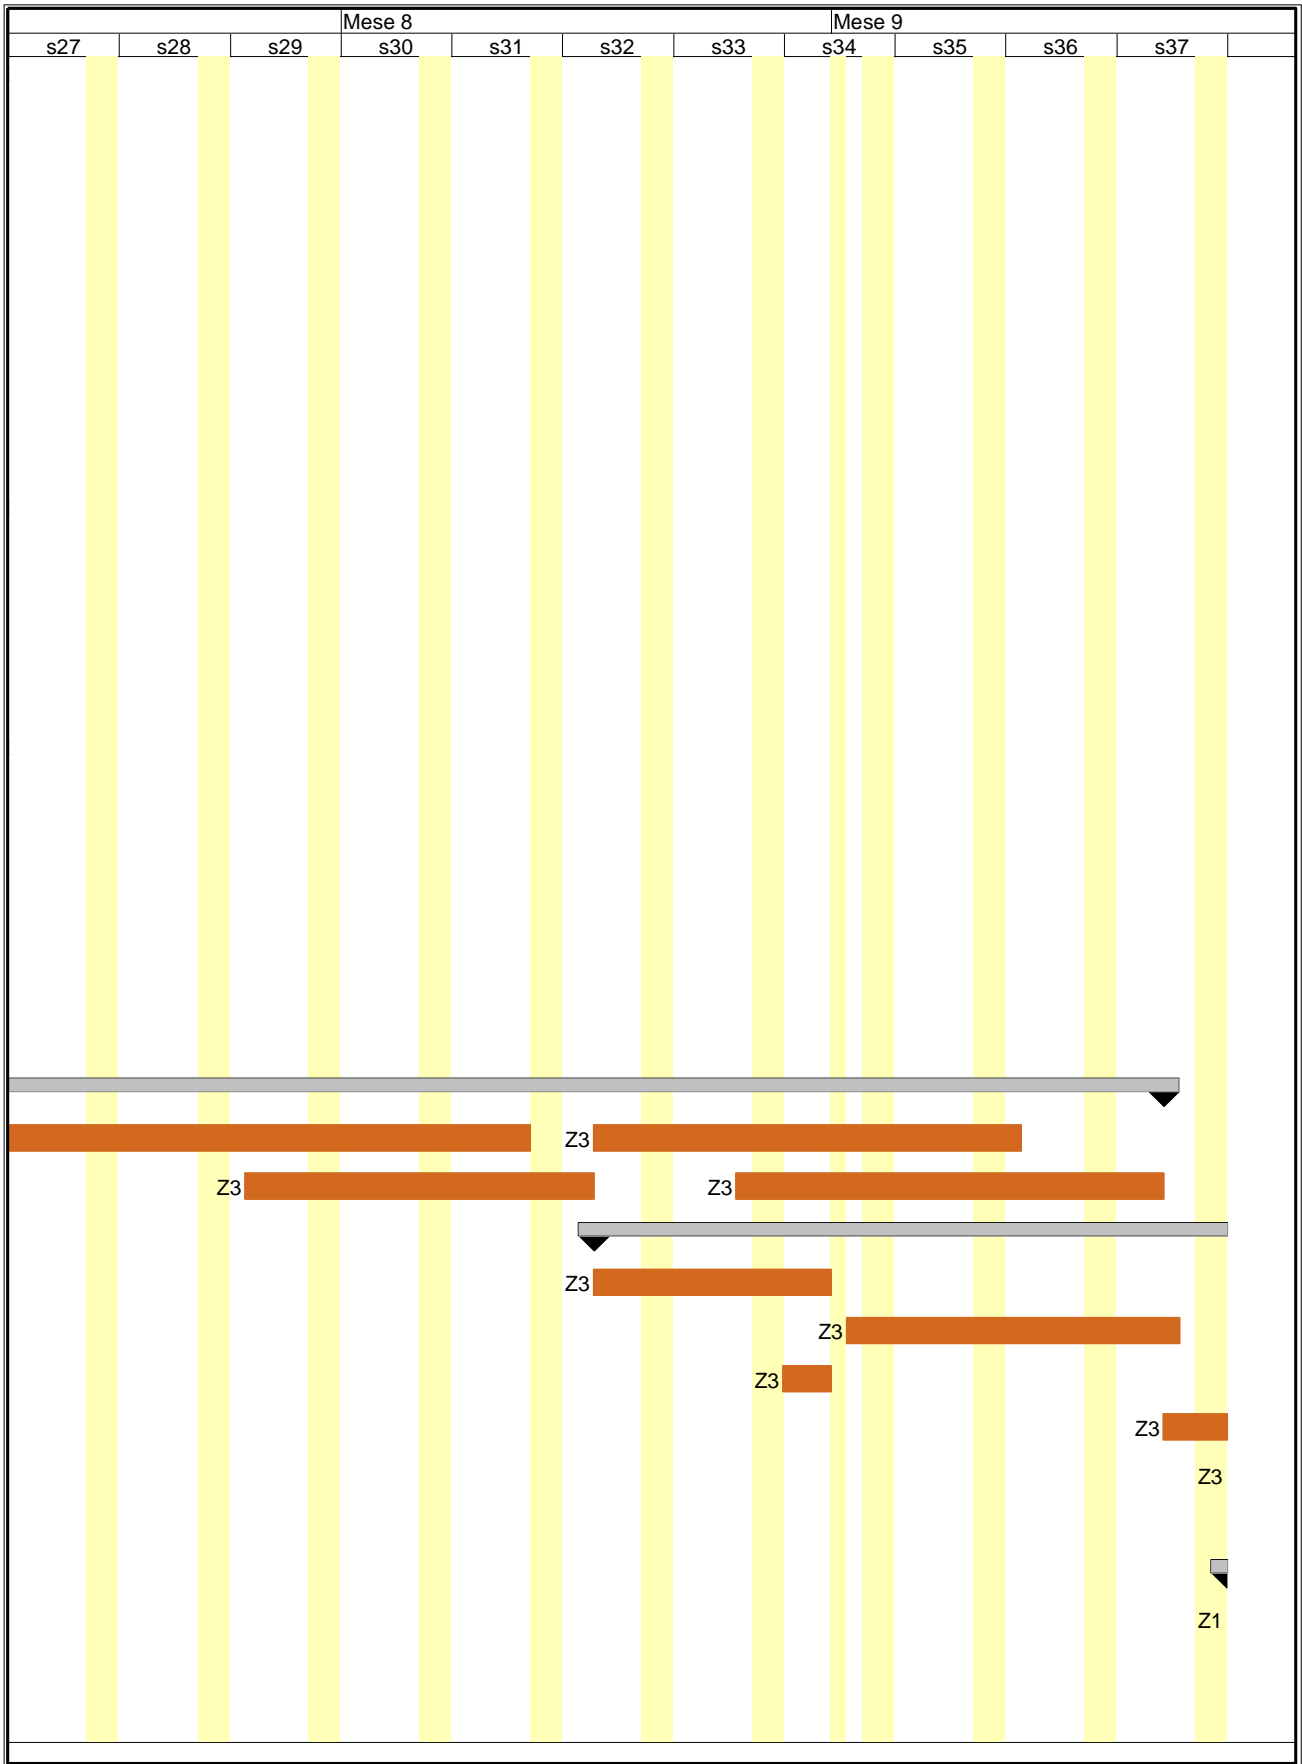


			Mese 8				Mese 9				
s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	

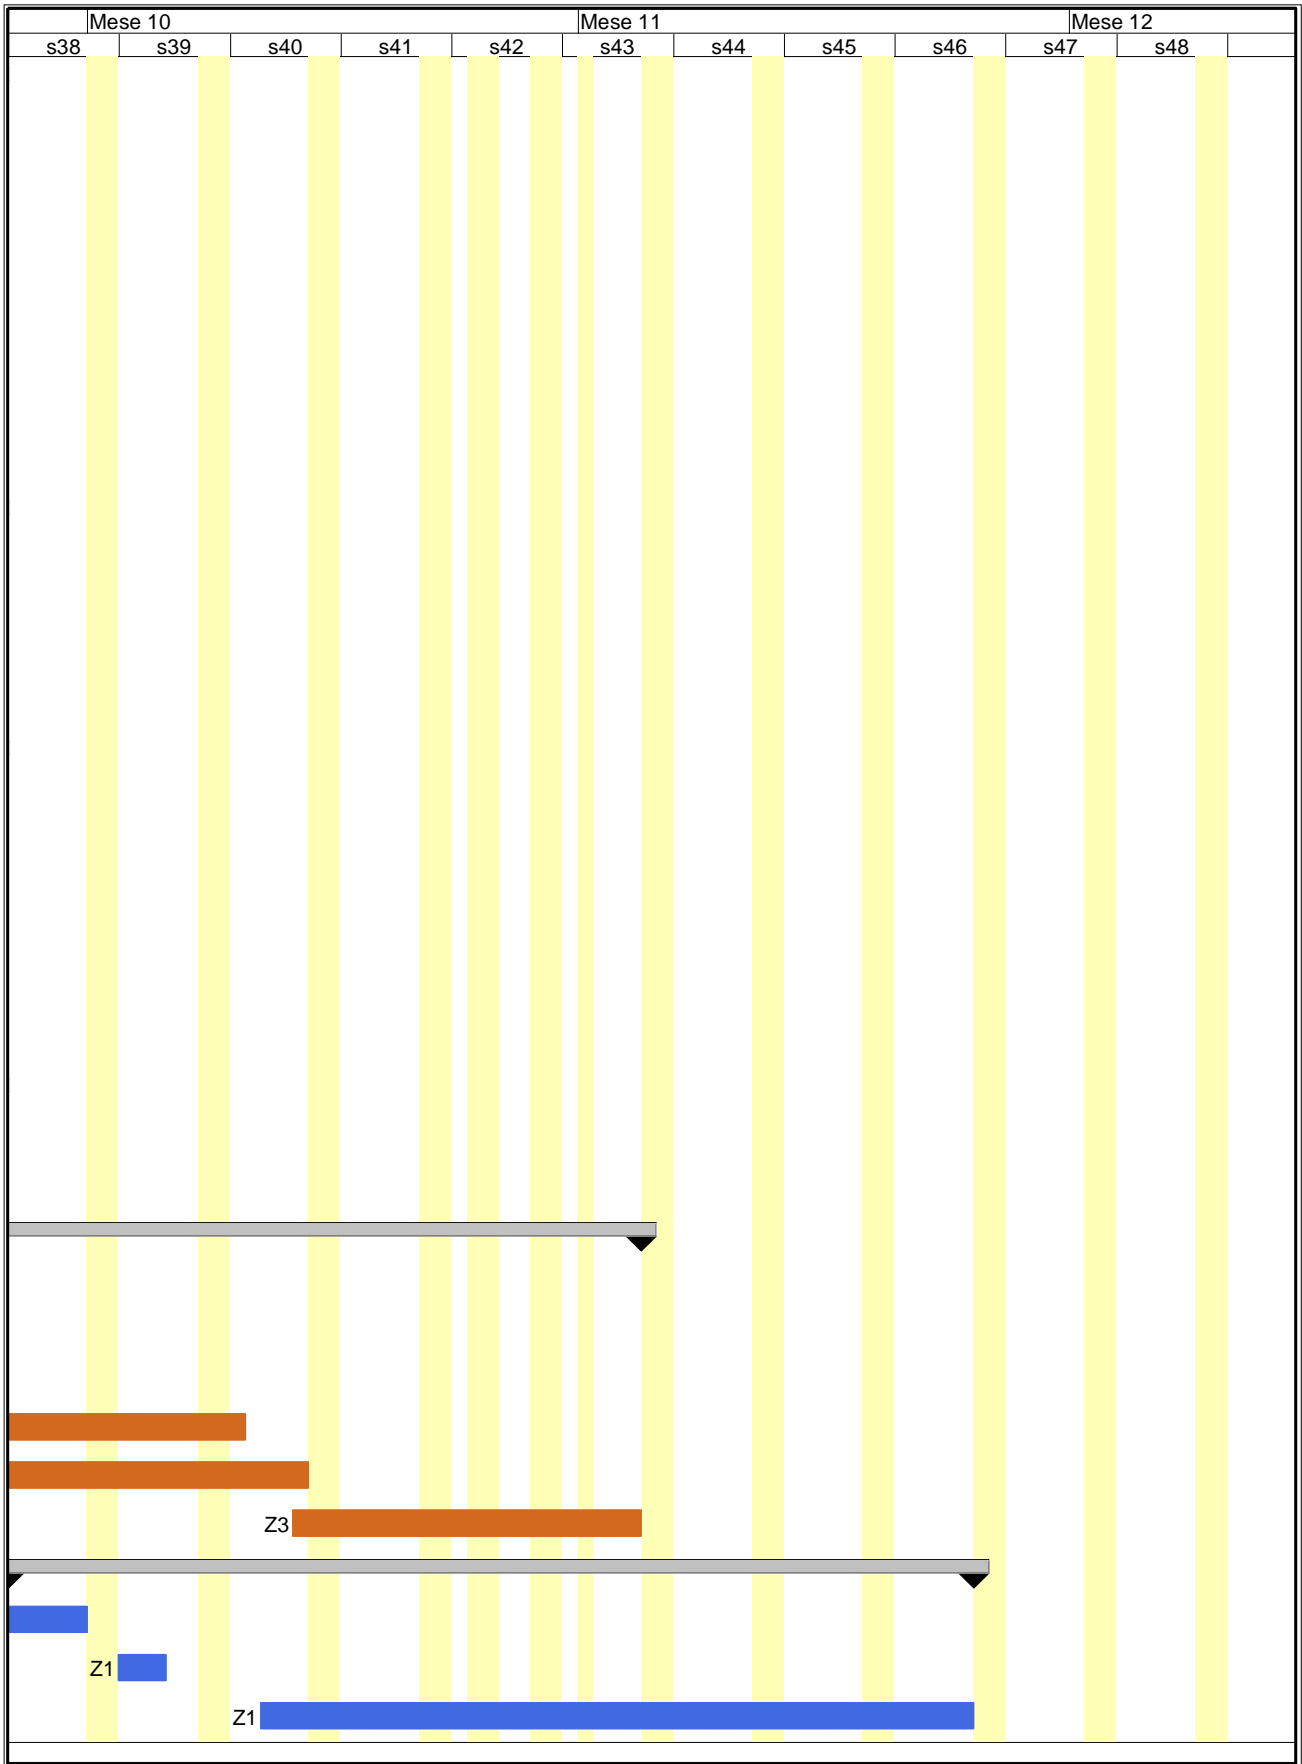

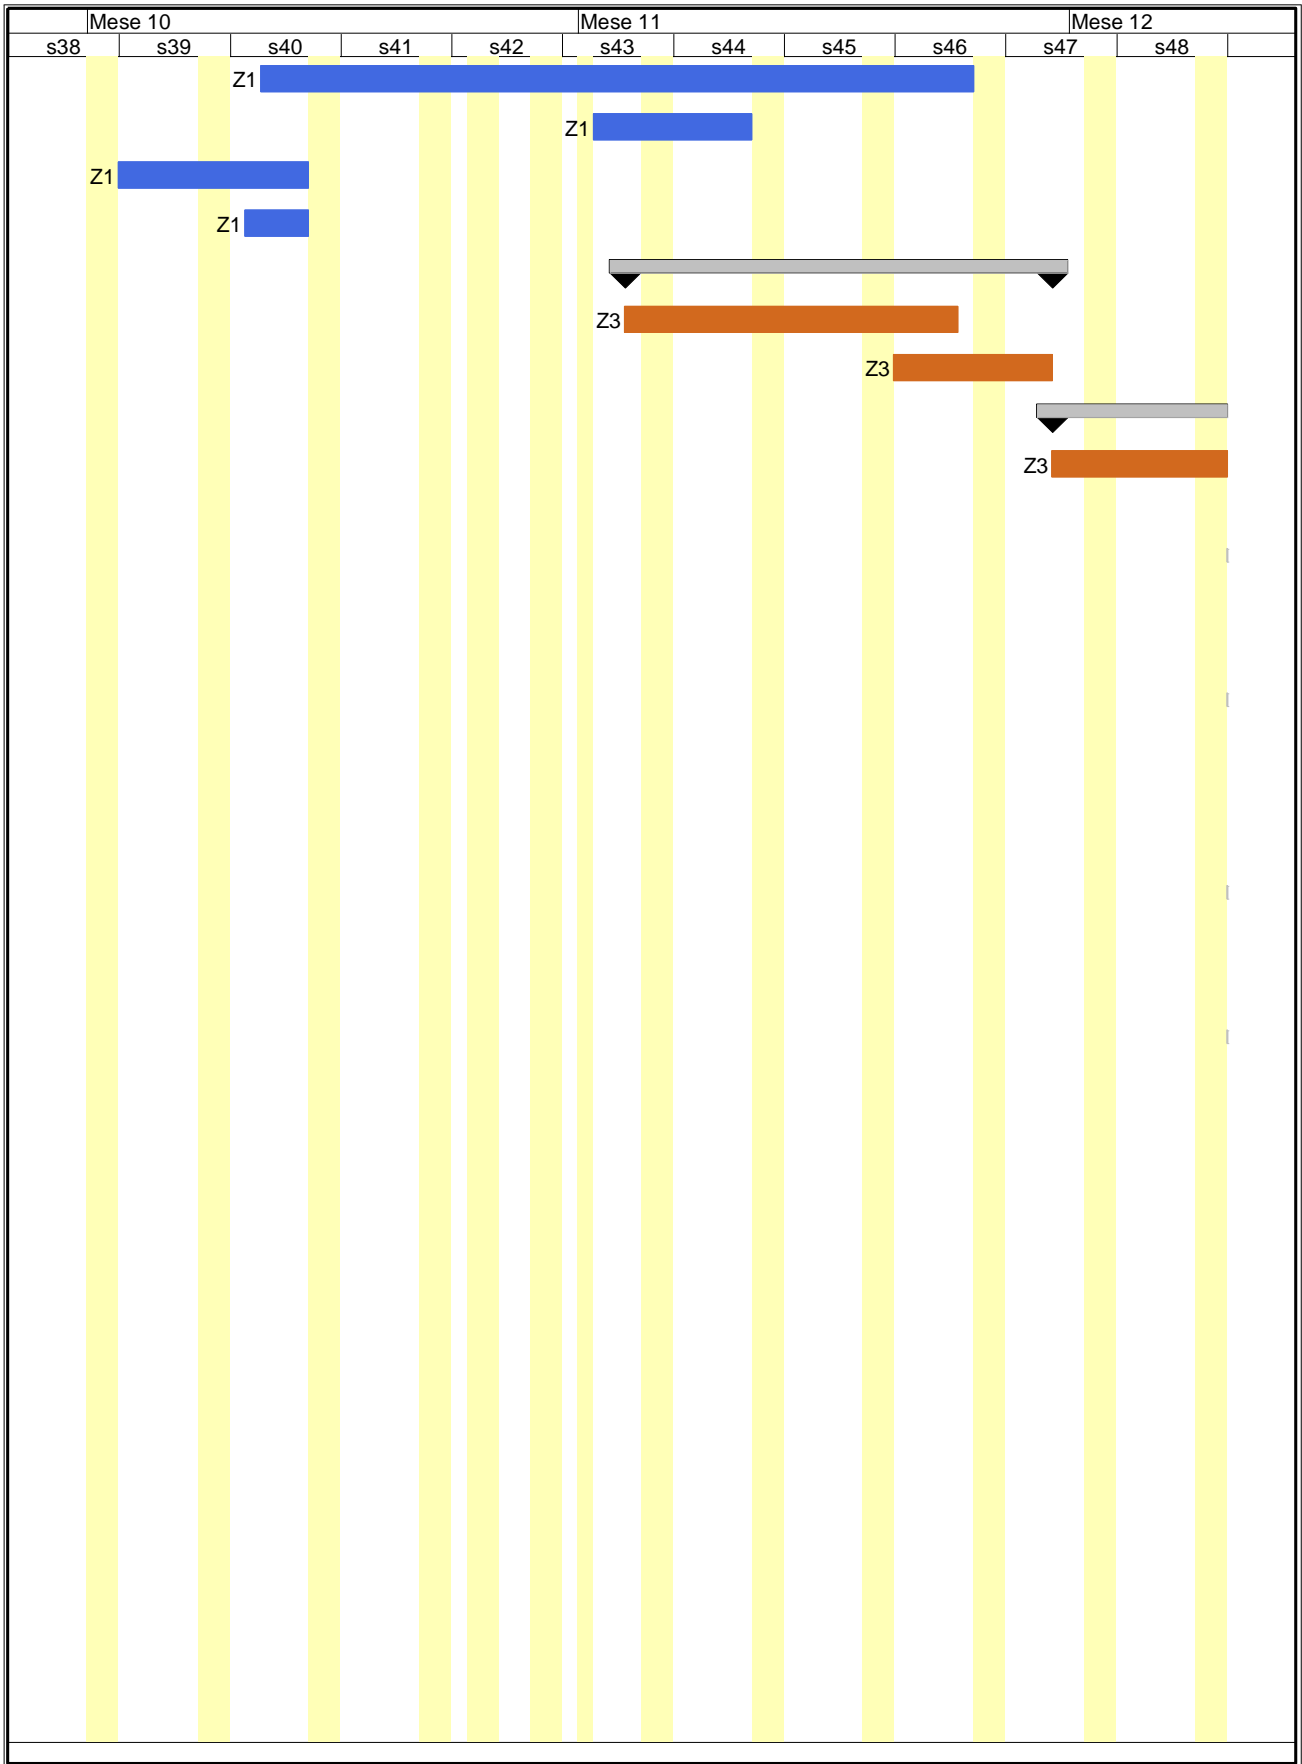

Mese 13						Mese 14					
s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	

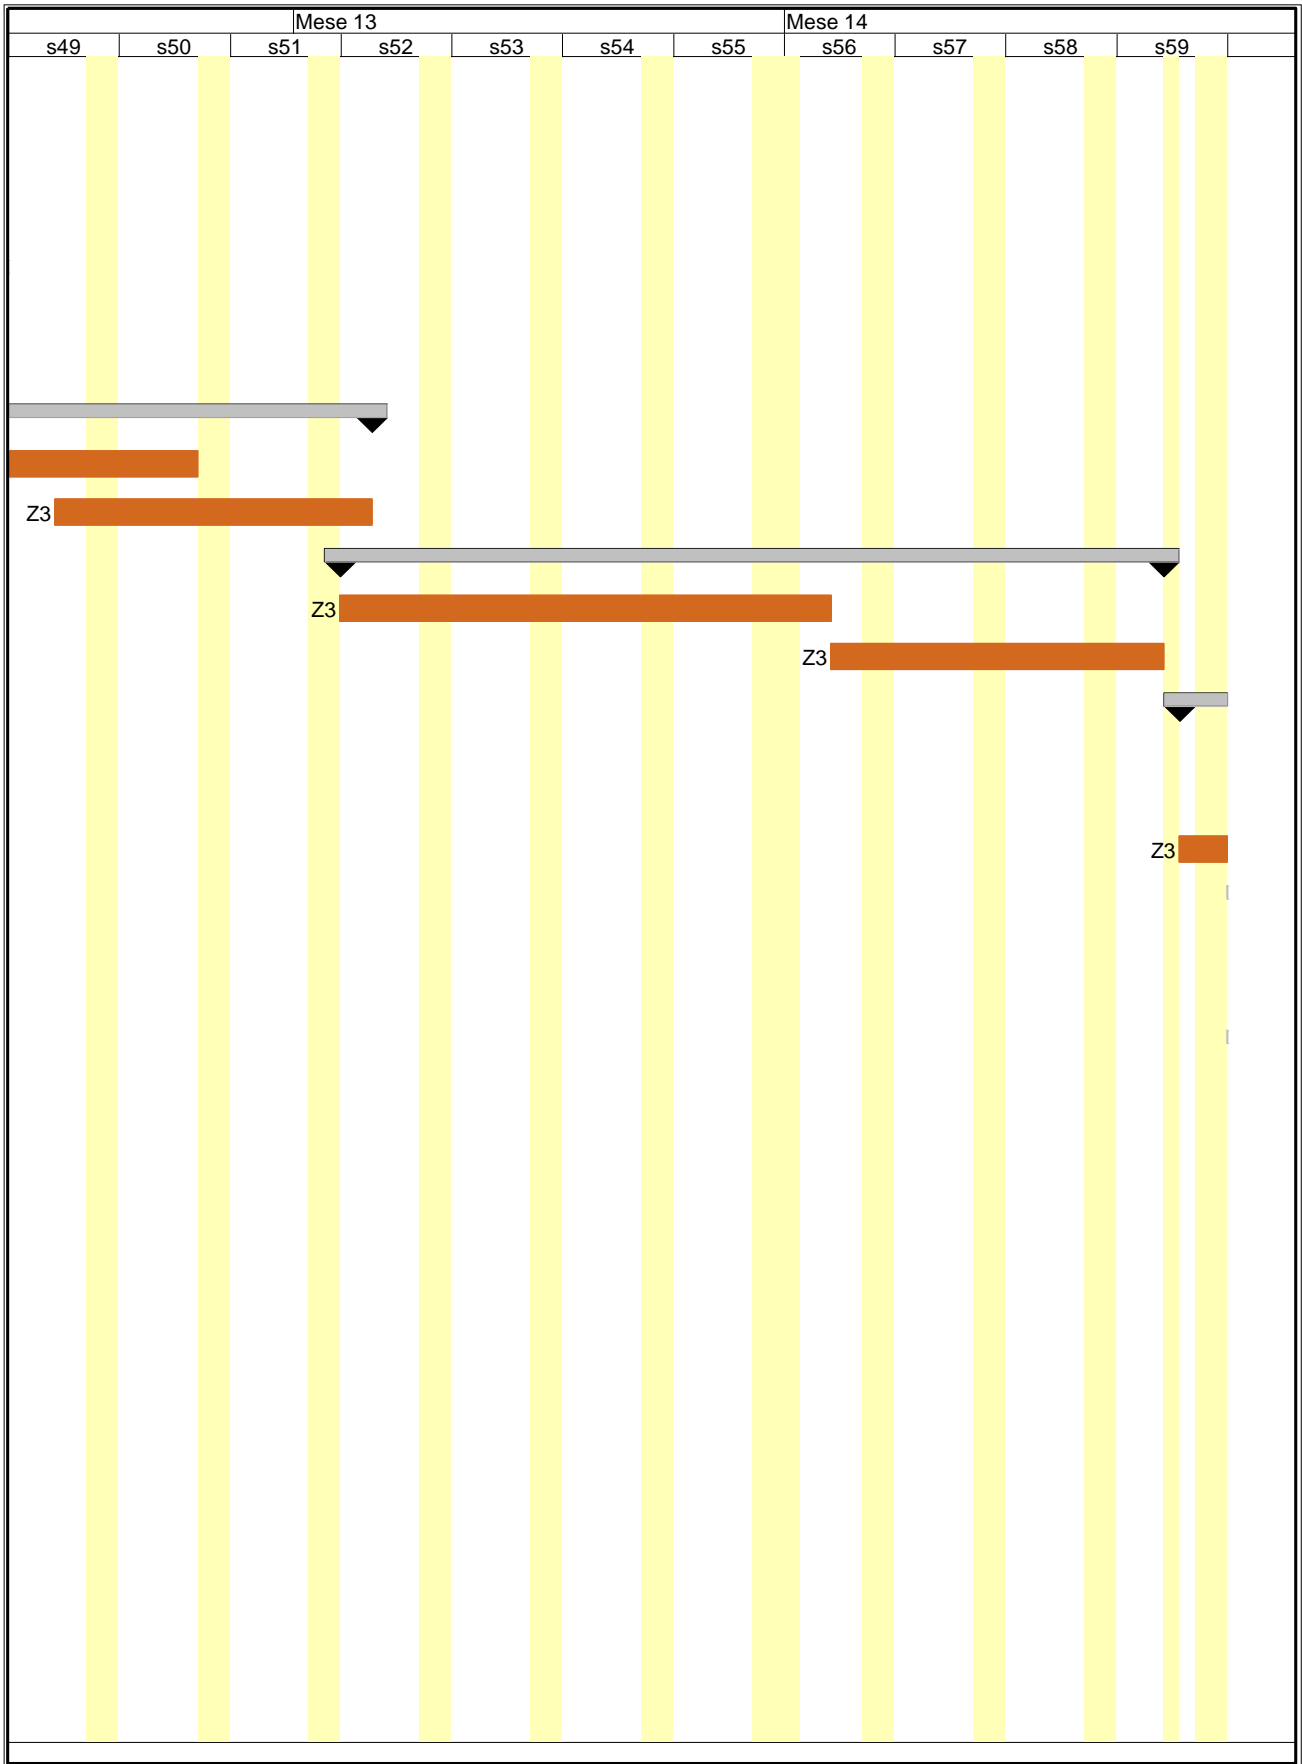

Mese 15		Mese 16						Mese 17		
s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70
							Z1			

