

L'AREA DI CANTIERE VERRA' DEFINITA CON L'IMPRESA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

LEGENDA	
	RECINZIONE h=2,00m
	INGRESSO AUTOMEZZI
	INGRESSO PEDONALE
	BARACCAMENTI
	AREA DI STOCCAGGIO
	AREA DEPOSITO ATTREZZATURE
	AREA DEPOSITO MACCHINARI
	AREA STAZIONAMENTO POMPA E BOTTE CLS
	CARTELLI DI CANTIERE
	PONTEGGIO METALLICO
	DISPENSORE DI TERRA
	QUADRO ELETTRICO
	AREA DI CANTIERE





PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA DELLO SPORT - LOCALITA' SCAVELLE

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NextGenerationEU"

Committente: COMUNE DI ROIATE (RM) Via della Chiesa, 7 – 00030 Roiate (Roma)		
PROGETTISTA: TS PROJECT SRL Società di Ingegneria Viale Giulio Cesare, 71 00192 Roma tsproject srl@gmail.com tsproject srl@pecimpresa.it	Tavola 18	Scala 1: 100
	DATA 11/04/2022	FILE —
	ALLEGATO	
	LAYOUT DI CANTIERE	
	AGGIORNAMENTI	

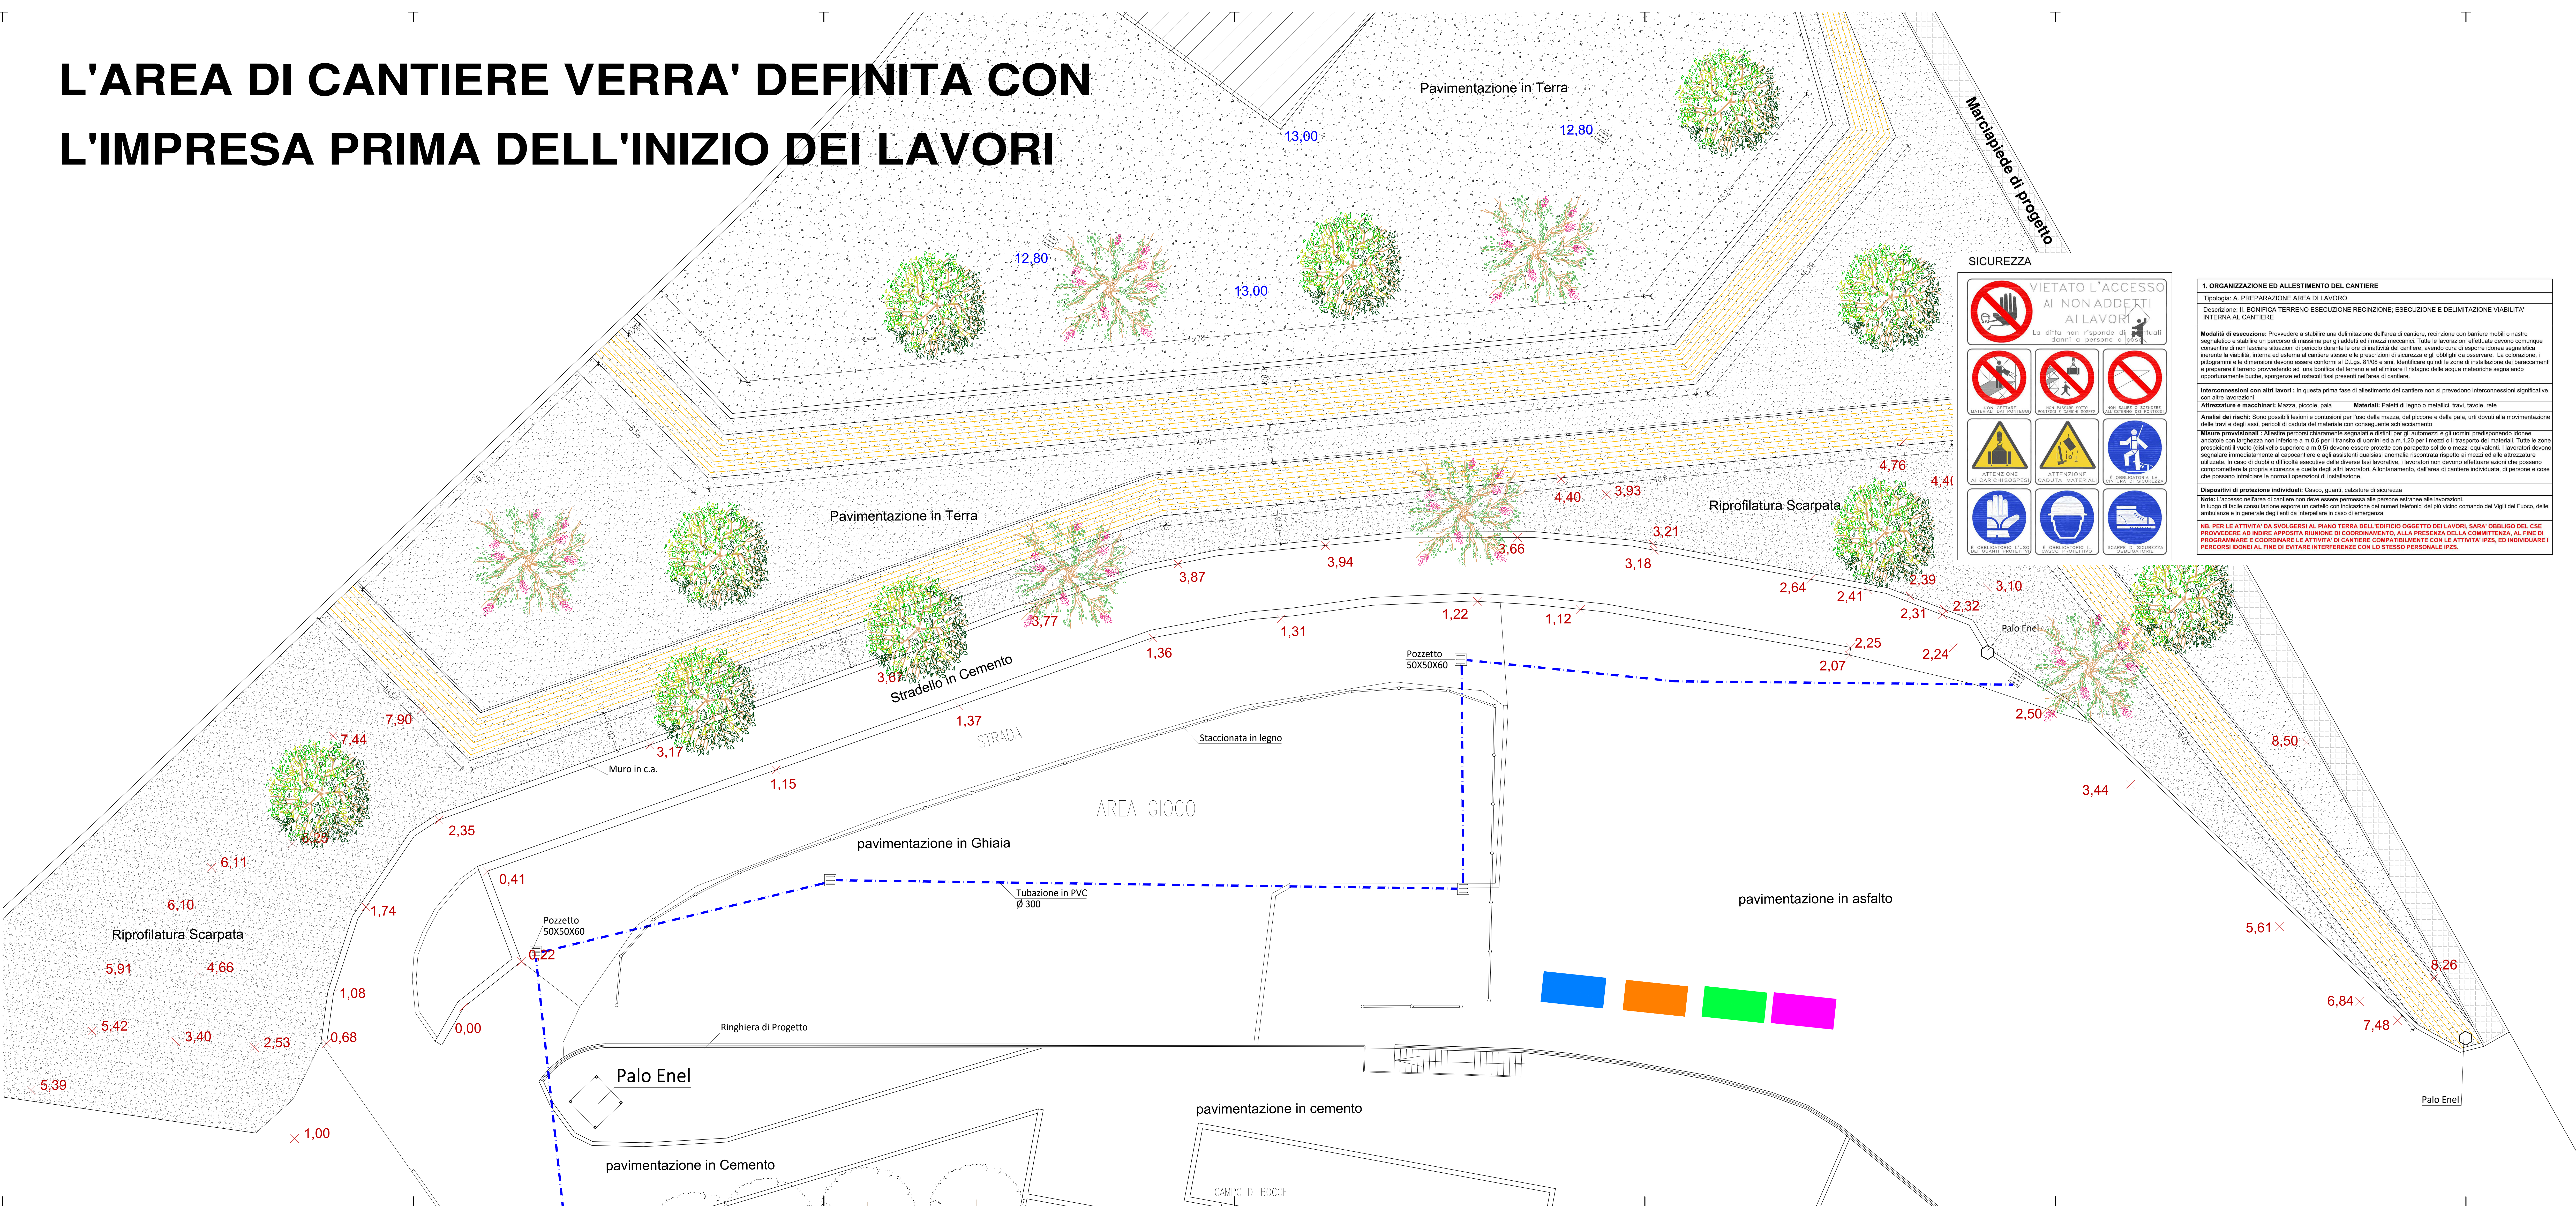

SICUREZZA

VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose

NON ENTRARE
NEL PERIMETRO
DEI LAVORI

NON PARCHEGGIARE
VEICOLI E CARICHI

ATTENZIONE
AL CADERE DI CORPI

ATTENZIONE
CAVITÀ, MATERIALI

CINTURA DI SICUREZZA

GUANTI PROTETTIVI

ELMETTO DI SICUREZZA

SCARPE DI SICUREZZA

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	
Tipologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO	
Descrizione: IL BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE	
Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 61/06 e smi. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e predisporre il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.	
Interconnessioni con altri lavori: In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni.	
Attrezzature e macchinari: Mazza, piccone, pala	
Materiali: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete	
Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento	
Misure preventive: Misure: percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andature con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m.1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantier e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.	
Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza	
Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permesso alle persone estranee alle lavorazioni. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.	
NB: PER LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO OGGETTO DEI LAVORI, SARÀ OBBLIGO DEL CSE PROVVEDERE AD IDONEA APPOSTA RIUNIONE DI COORDINAMENTO, ALLA PRESENZA DELLA COMMITTEEA, AL FINE DI PROGRAMMARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DI CANTIERE COMPATIBILMENTE CON LE ATTIVITA' IPZS, ED INDIVIDUARE I PERCORSI IDONEI AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE CON LO STESSO PERSONALE IPZS.	
